




公費解体の進捗状況（令和7年6月末）

- 公費解体加速化プランの解体見込棟数の **81.0%**、申請棟数の **74.2%**となる **約3万2千棟**の解体が完了
（6月末累計 計画:30,509棟 実績:31,778棟 **達成率:104%**）
- 申請棟数の推移や、多くの市町で申請期限を迎えたことを踏まえ、国や市町と協議の上、**今月中を目途に、解体見込棟数等を見直し、「公費解体加速化プラン」の改定を行う**（見込棟数 **39,235棟** ⇒ 申請棟数 **42,854棟**）
- 解体見込棟数は増加するが、**今年10月の公費解体完了目標を維持**

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1改定】									
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	①解体見込棟数（単月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	3,095	2,379	2,007	1,245
	②"（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	33,604	35,983	37,990	39,235
解体実績	解体率（累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%
	申請実績（累計）	3,087	10,557	17,119	21,767	25,212	28,198	30,040	31,865	33,411	34,839	36,304	37,188	38,825	40,029	41,674	42,854				
	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118				
	④"（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778				
	解体率（見込棟数あたり）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%	48.3%	57.3%	66.3%	73.0%	81.0%				
	"（申請棟数あたり）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.1%	7.9%	11.9%	18.0%	25.7%	33.0%	39.9%	44.2%	52.5%	60.7%	66.9%	74.2%				
	計画達成率（単月）(③÷①)						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%	85%	104%				
	"（累計）(④÷②)	—	—	—	—	—	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%	106%	107%	104%	104%				

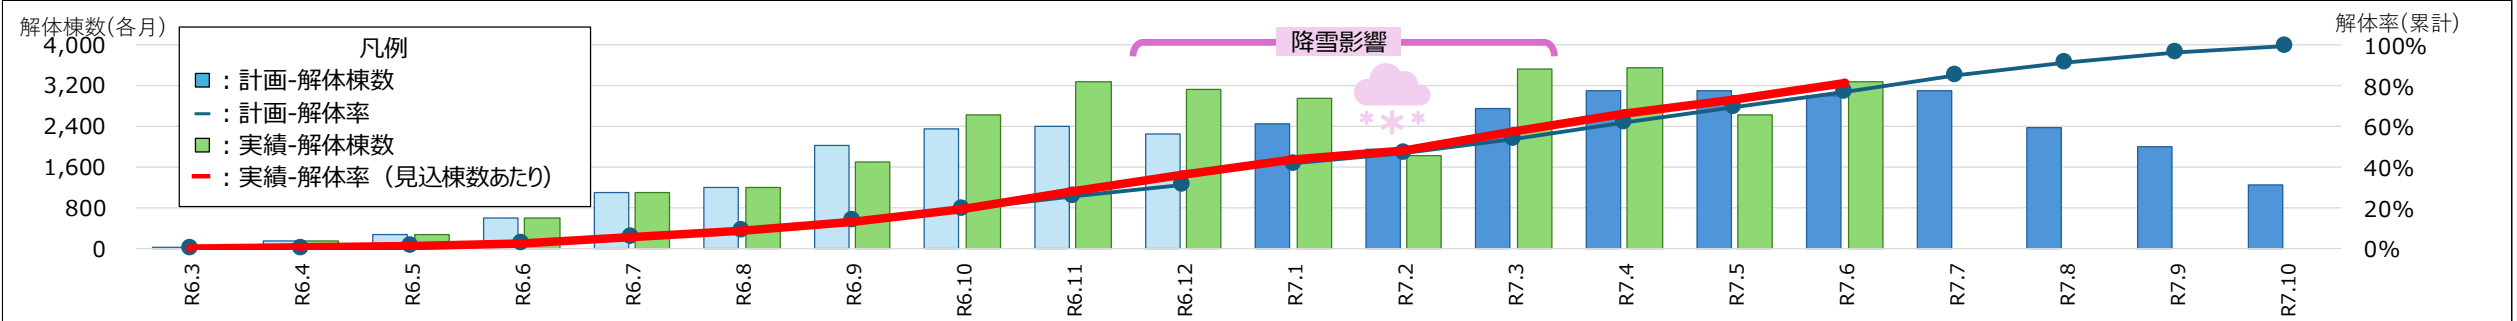

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の進捗状況（令和7年6月末）



・穴水町の約9割、珠洲市、輪島市、志賀町の約8割で公費解体が完了

市町	解体見込棟数 〔R7.1〕A	申請棟数 B	完了棟数 C	公費解体	緊急解体	自費解体	見込棟数あたり 解体率 C ÷ A	申請棟数あたり 解体率 C ÷ B
珠洲市	8,023 〔43〕	8,343 〔47〕	6,879 〔13〕	6,725 〔13〕	111 〔0〕	43 〔0〕	85.7% 〔30.2%〕	82.5% 〔27.7%〕
輪島市	11,267 〔276〕	12,493 〔217〕	9,379 〔0〕	9,077 〔0〕	259 〔0〕	43 〔0〕	83.2% 〔0.0%〕	75.1% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	4,357 〔18〕	2,957 〔12〕	2,900 〔12〕	2 〔0〕	55 〔0〕	74.8% 〔75.0%〕	67.9% 〔66.7%〕
穴水町	2,703	2,796	2,452	2,418	0	34	90.7%	87.7%
七尾市	5,900	6,208	3,861	3,402	0	459	65.4%	62.2%
志賀町	4,233	4,919	3,726	3,333	9	384	88.0%	75.7%
上記以外の市町	3,158	3,738	2,524	2,124	4	396	79.9%	67.5%
計	39,235 〔335〕	42,854 〔282〕	31,778 〔25〕	29,979 〔25〕	385 〔0〕	1,414 〔0〕	81.0% 〔7.5%〕	74.2% 〔8.9%〕

※能美市、加賀市は、公費解体完了。公費解体は、14市町で実施中

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

災害廃棄物の処理状況（令和7年5月末・暫定値）




- 発生推計量410万トンの **56.9%**となる **233万トン**の処理が完了
- 5月単月 計画：27万トン 実績：22万トン 達成率：81%
- 5月末累計 計画:225万トン 実績:233万トン 達成率:103%

(単位：千トン)

		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
処理計画※	解体ごみの推計発生量（単月）	2			17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	327	251	212	132					
	①処理量（単月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	273	261	261	273	259	221	29	14	8
	②　　"　　（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,773	3,034	3,294	3,567	3,826	4,047	4,076	4,090	4,098
	処理率（累計）	0.07%	0.40%	0.86%	1.4%	2.1%	3.1%	6.0%	8.8%	12%	17%	22%	28%	32%	36%	42%	48%	55%	61%	68%	74%	80%	87%	93%	99%	99%	99%	100%
処理実績	③処理実績（単月）	4	14	19	21	29	43	115	116	143	190	230	230	220	185	280	270	220										
	④　　"　　（累計）	4	18	37	58	87	131	246	362	505	695	925	1,155	1,375	1,560	1,841	2,110	2,330										
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.43%	0.89%	1.4%	2.1%	3.2%	6.0%	8.8%	12.3%	17.0%	22.6%	28.2%	33.6%	38.1%	44.9%	51.5%	56.9%										
	計画達成率（単月） （③÷①）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	137%	105%	113%	103%	81%										
	計画達成率（累計） （④÷②）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106%	106%	107%	107%	103%										

※ 加速化プラン【R7.1改定】

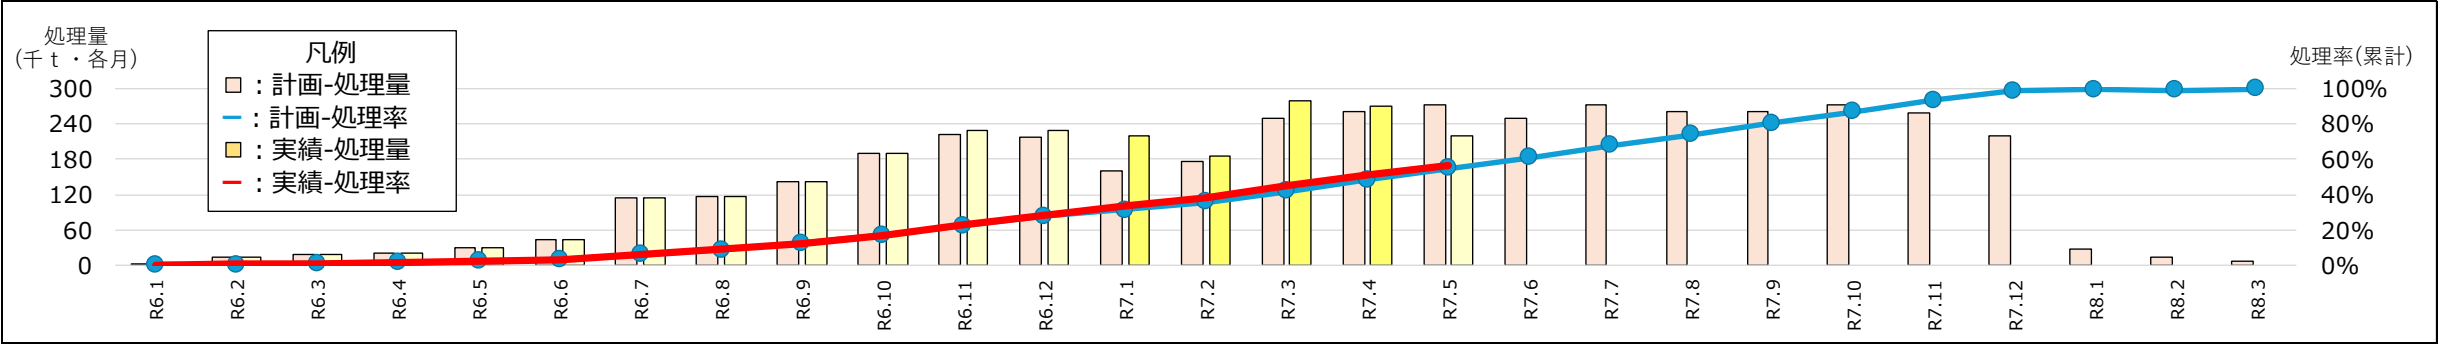

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計 ※処理実績は、最新の集計値を使用

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年5月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	処理率 B ÷ A
珠洲市	858	579 (100%)	61 (10.6%)	83 (14.3%)	252 (43.6%)	9 (1.6%)	173 (29.9%)	0 (0.0%)	67.4%
輪島市	1,132	747 (100%)	66 (8.8%)	110 (14.7%)	318 (42.6%)	18 (2.4%)	235 (31.5%)	0 (0.0%)	66.1%
能登町	411	200 (100%)	13 (6.4%)	45 (22.2%)	66 (33.0%)	4 (2.1%)	73 (36.3%)	0 (0.0%)	48.7%
穴水町	278	209 (100%)	19 (9.3%)	30 (14.4%)	109 (52.1%)	4 (2.0%)	46 (22.2%)	0 (0.0%)	75.0%
七尾市	632	253 (100%)	24 (9.5%)	46 (18.2%)	91 (35.8%)	5 (2.1%)	87 (34.4%)	0 (0.0%)	40.0%
志賀町	502	183 (100%)	8 (4.4%)	44 (23.9%)	80 (43.7%)	3 (1.5%)	48 (26.4%)	0 (0.0%)	36.5%
上記以外の市 町	283.7	159.0 (100%)	8.0 (5.0%)	28.6 (18.0%)	44.2 (27.8%)	3.2 (2.0%)	74.9 (47.1%)	0.1 (0.1%)	56.1%
合 計	4,098	2,330 (100%)	199 (8.5%)	386 (16.6%)	960 (41.2%)	47 (2.0%)	738 (31.7%)	1 (0.0%)	56.9%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計で処理量に自費解体分は含まない。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など

※「発生推計量 A」は、環境省の技術資料に基づく1棟あたりの発生量から推計したもの
