

令和7年6月6日(金)
生活環境部資源循環推進課
担当者 岡 秀雄
内線 4240
外線 076-225-1470

公費解体加速化プランの進捗状況について

公費解体加速化プランに基づき、公費解体の進捗状況及び災害廃棄物の処理状況について、別紙のとおり公表します。なお、同様の内容を県ホームページでも掲載します。

公費解体の進捗状況（令和7年5月末）


➤ 解体見込棟数の **73.0%**、申請棟数の **68.8%**となる **28,660棟**の解体が完了

➤ 5月単月 計画: 3,100棟 実績: 2,629棟 達成率: 85%

➤ 5月末累計 計画:27,503棟 実績:28,660棟 達成率:104%

5月単月における解体棟数は、大型連休の影響もあり、計画を下回ったものの、累計では計画を上回った。

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1改定】										
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	
解体計画	①解体見込棟数（単月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	3,095	2,379	2,007	1,245	
	② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	33,604	35,983	37,990	39,235	
	解体率（累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%	
解体実績	申請実績（累計）	3,087	10,557	17,119	21,767	25,212	28,198	30,040	31,865	33,411	34,839	36,304	37,188	38,825	40,029	41,674						
	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629						
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660						
	解体率（見込棟数あたり）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%	48.3%	57.3%	66.3%	73.0%						
	"（申請棟数あたり）	0.0%	0.4%	1.1%	2.6%	5.3%	8.1%	12.2%	18.6%	26.4%	34.0%	41.1%	45.5%	54.0%	62.5%	68.8%						
	計画達成率(単月)(③÷①)	-	-	-	-	-	100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%	85%						
	"（累計)(④÷②)	-	-	-	-	-	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%	106%	107%	104%						

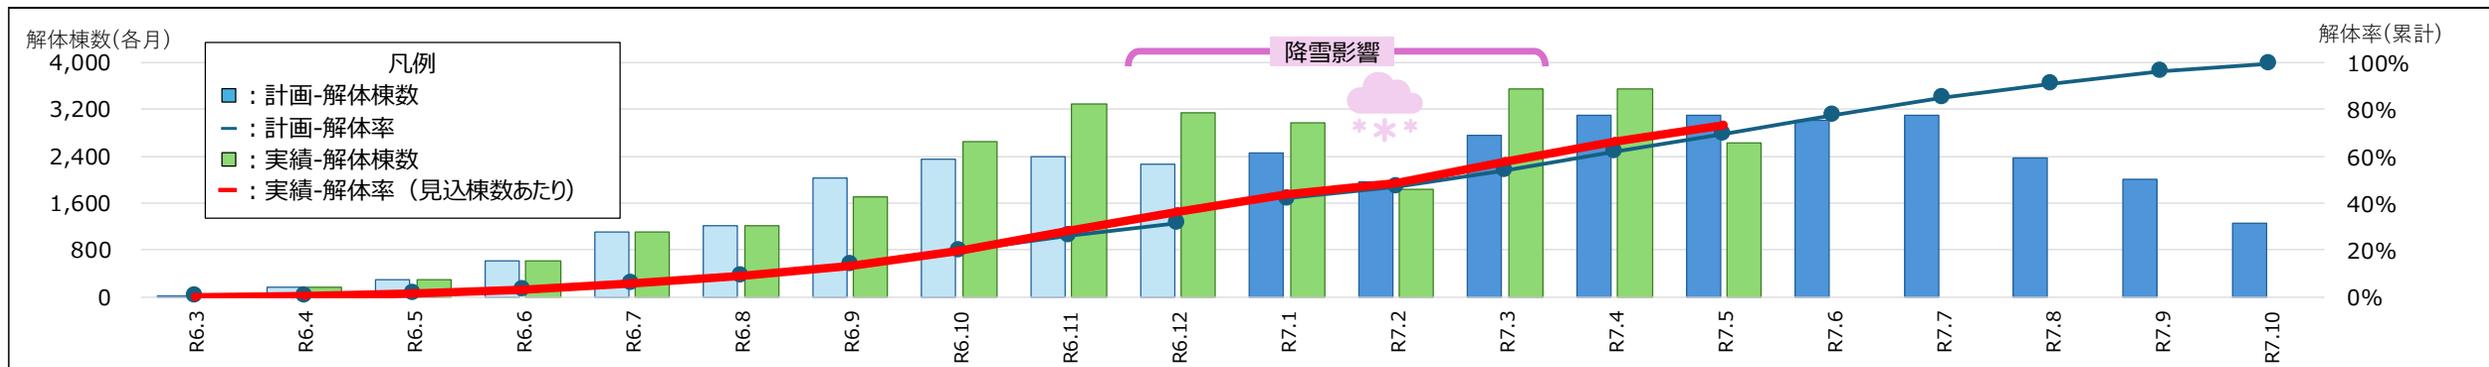

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の状況（令和7年5月末）



市町	解体見込棟数 〔R7.1〕A	申請棟数 B	完了棟数 C	完了棟数 C			見込棟数あたり 解体率 C ÷ A	申請棟数あたり 解体率 C ÷ B
				公費解体	緊急解体	自費解体		
珠洲市	8,023 〔43〕	8,016 〔50〕	6,431 〔7〕	6,277 〔7〕	111 〔0〕	43 〔0〕	80.2% 〔16.3%〕	80.2% 〔14.0%〕
輪島市	11,267 〔276〕	12,547 〔233〕	8,414 〔0〕	8,145 〔0〕	229 〔0〕	40 〔0〕	74.7% 〔0.0%〕	67.1% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	4,188 〔17〕	2,632 〔5〕	2,578 〔5〕	2 〔0〕	52 〔0〕	66.6% 〔31.3%〕	62.8% 〔29.4%〕
穴水町	2,703	2,789	2,330	2,296	0	34	86.2%	83.5%
七尾市	5,900	5,853	3,373	2,947	0	426	57.2%	57.6%
志賀町	4,233	4,547	3,169	2,855	9	305	74.9%	69.7%
上記以外の市町	3,158	3,734	2,311	1,911	4	396	73.2%	61.9%
計	39,235 〔335〕	41,674 〔300〕	28,660 〔12〕	27,009 〔12〕	355 〔0〕	1,296 〔0〕	73.0% 〔3.6%〕	68.8% 〔4.0%〕

※能美市、加賀市は、公費解体完了。公費解体は、14市町で実施中

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計

〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

災害廃棄物の処理状況（令和7年4月末・暫定値）




- 発生推計量410万トンの **52.5%**となる **215万トン**の処理が完了
- 4月単月 計画：26万トン 実績：27万トン 達成率：105%
- 4月末累計 計画：198万トン 実績：215万トン 達成率：109%

4月は、運搬車両や処理施設の確保が進んだことなどにより計画を上回った。
 （運搬車両：計画 2.9万台/月→実績 3.0万台/月）
 （県外民間施設：24業者(R7.3)→28業者(R7.4)）

（単位：千トン）

		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	
処理計画	解体ごみの推計発生量（単月）			2	17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	327	251	212	132						
	①処理量（単月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	273	261	261	273	259	221	29	14	8	
	② "（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,773	3,034	3,294	3,567	3,826	4,047	4,076	4,090	4,098	
	処理率（累計）	0.07%	0.40%	0.86%	1.4%	2.1%	3.1%	6.0%	8.8%	12%	17%	22%	28%	32%	36%	42%	48%	55%	61%	68%	74%	80%	87%	93%	99%	99%	99%	100%	
処理実績	③処理実績（単月）	4	14	19	22	29	44	118	120	149	197	236	234	223	186	283	272												
	④ "（累計）	4	18	37	58	88	131	249	369	519	716	952	1,186	1,409	1,594	1,877	2,150												
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.43%	0.89%	1.4%	2.1%	3.2%	6.1%	9.0%	12.7%	17.5%	23.2%	28.9%	34.4%	38.9%	45.8%	52.5%												
	計画達成率（単月） （③÷①）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139%	105%	114%	105%											
	計画達成率（累計） （④÷②）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109%	108%	109%	109%											

※ 加速化プラン【R7.1改定】

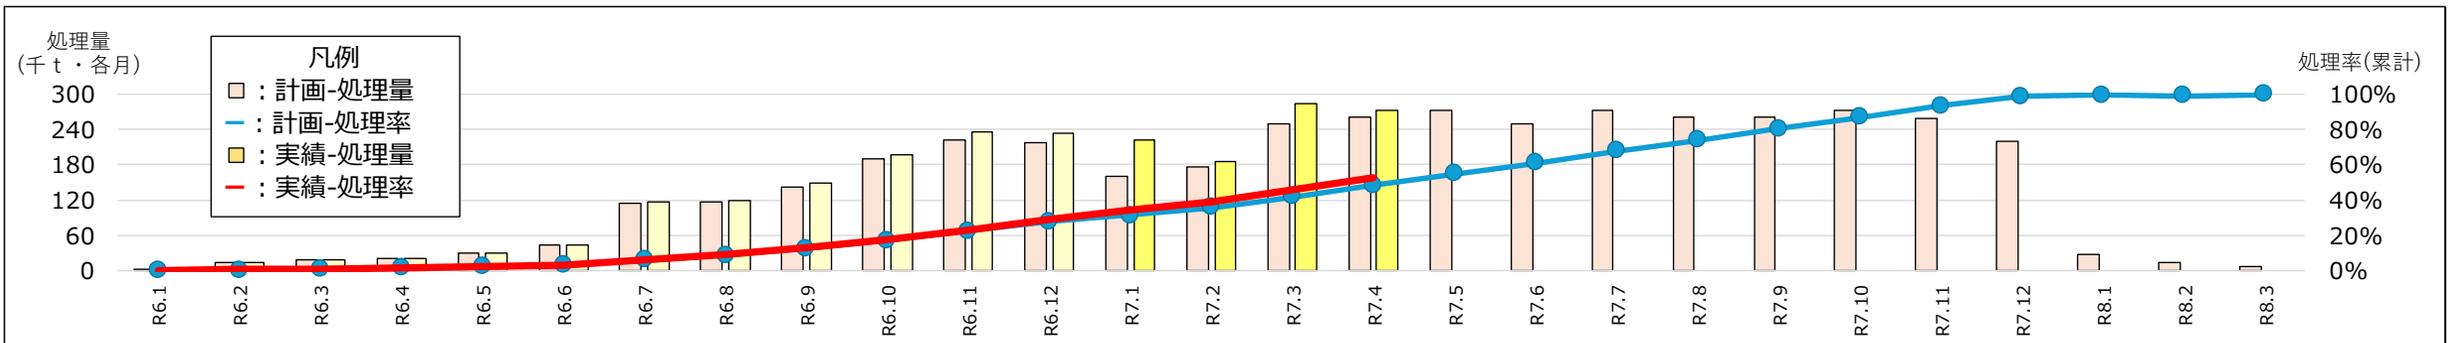

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計 ※処理実績は、最新の集計値を使用

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年4月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	処理物の種類						処理率 B ÷ A
			可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	
珠州市	858	535 (100%)	59 (11.0%)	72 (13.4%)	235 (43.9%)	9 (1.7%)	161 (30.1%)	0 (0.0%)	62.3%
輪島市	1,132	665 (100%)	62 (9.3%)	90 (13.5%)	287 (43.2%)	16 (2.4%)	210 (31.6%)	0 (0.0%)	58.8%
能登町	411	188 (100%)	13 (6.9%)	41 (21.8%)	63 (33.7%)	4 (2.1%)	67 (35.5%)	0 (0.0%)	45.6%
穴水町	278	197 (100%)	19 (9.9%)	28 (14.3%)	103 (52.2%)	4 (2.0%)	43 (21.6%)	0 (0.0%)	70.7%
七尾市	632	244 (100%)	23 (9.5%)	47 (19.2%)	89 (36.3%)	5 (1.9%)	81 (33.0%)	0 (0.0%)	38.6%
志賀町	502	176 (100%)	8 (4.5%)	40 (22.7%)	82 (46.6%)	3 (1.5%)	43 (24.7%)	0 (0.0%)	35.0%
上記以外の市 町	283.7	145.2 (100%)	7.2 (4.9%)	25.8 (17.8%)	42.0 (28.9%)	2.9 (2.0%)	67.1 (46.3%)	0.1 (0.1%)	51.2%
合計	4,098	2,150 (100%)	191 (8.9%)	343 (16.0%)	900 (41.9%)	43 (2.0%)	671 (31.2%)	1 (0.0%)	52.5%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計で処理量に自費解体分は含まない。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など

※「発生推計量 A」は、環境省の技術資料に基づく1棟あたりの発生量から推計したもの
