

# これまでの断水・給水対応の状況



## ○ 断水の状況

1月1日 16市町 約 11万戸 【最大】



8市町 約6万6千戸 で断水解消

1月26日 8市町 約 44,145戸 【現状】

(内訳)

輪島市	約10,000戸	珠洲市	約4,800戸
穴水町	約 2,600戸	能登町	約5,300戸
七尾市	約15,400戸	志賀町	約5,200戸
羽咋市	約 85戸	内灘町	約 760戸

※断水解消

白山市、加賀市、津幡町、宝達志水町、  
金沢市、能美市、中能登町、かほく市

## ○ 給水対応

給水車派遣：日本水道協会（全国の241自治体）  
陸上自衛隊、航空自衛隊  
国土交通省 各地方整備局


延べ3,900台

給水支援：海上保安庁の巡視船、海上自衛隊の  
多用途支援艦による給水車への水の補給



# 水道の応急復旧の流れ

## 応急復旧の手順

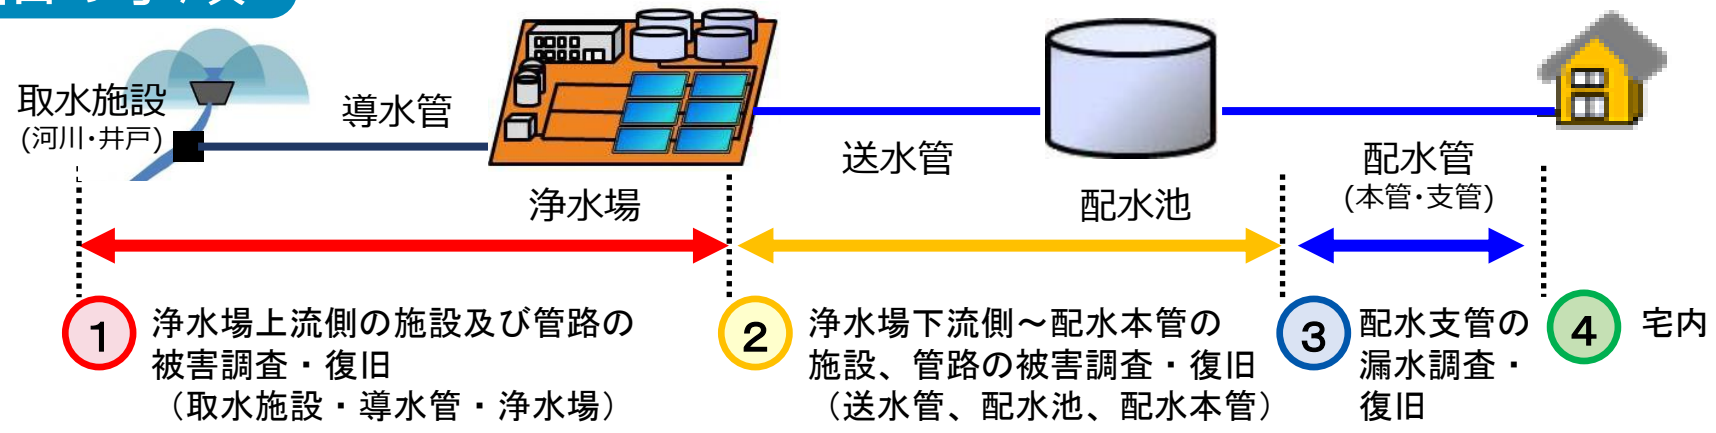

浄水場の被災



配管の修繕

珠洲市の宝立浄水場、輪島市の輪島浄水場、七尾市の岩屋浄水場など、各市町の主要な浄水場も多数被災

凍結の場合などの住宅地に近い配水池・配水管の損傷と異なり、今回の震災では、大元の浄水場の損傷や浄水場に通じる道路の被害があったことに加え、配水管も広範囲に損傷しているため、復旧に時間を要している


# 断水解消に向けた復旧作業の状況



- 日本水道協会の応援協力を頂き、応急復旧を進めている
- 6市町では、おおむね被災した浄水場の機能回復を終え、水を流して漏水調査・修繕を行う作業に入っている

今後、通水エリアを拡大し、  
1日も早い復旧を目指す

＜応急復旧班の派遣状況＞

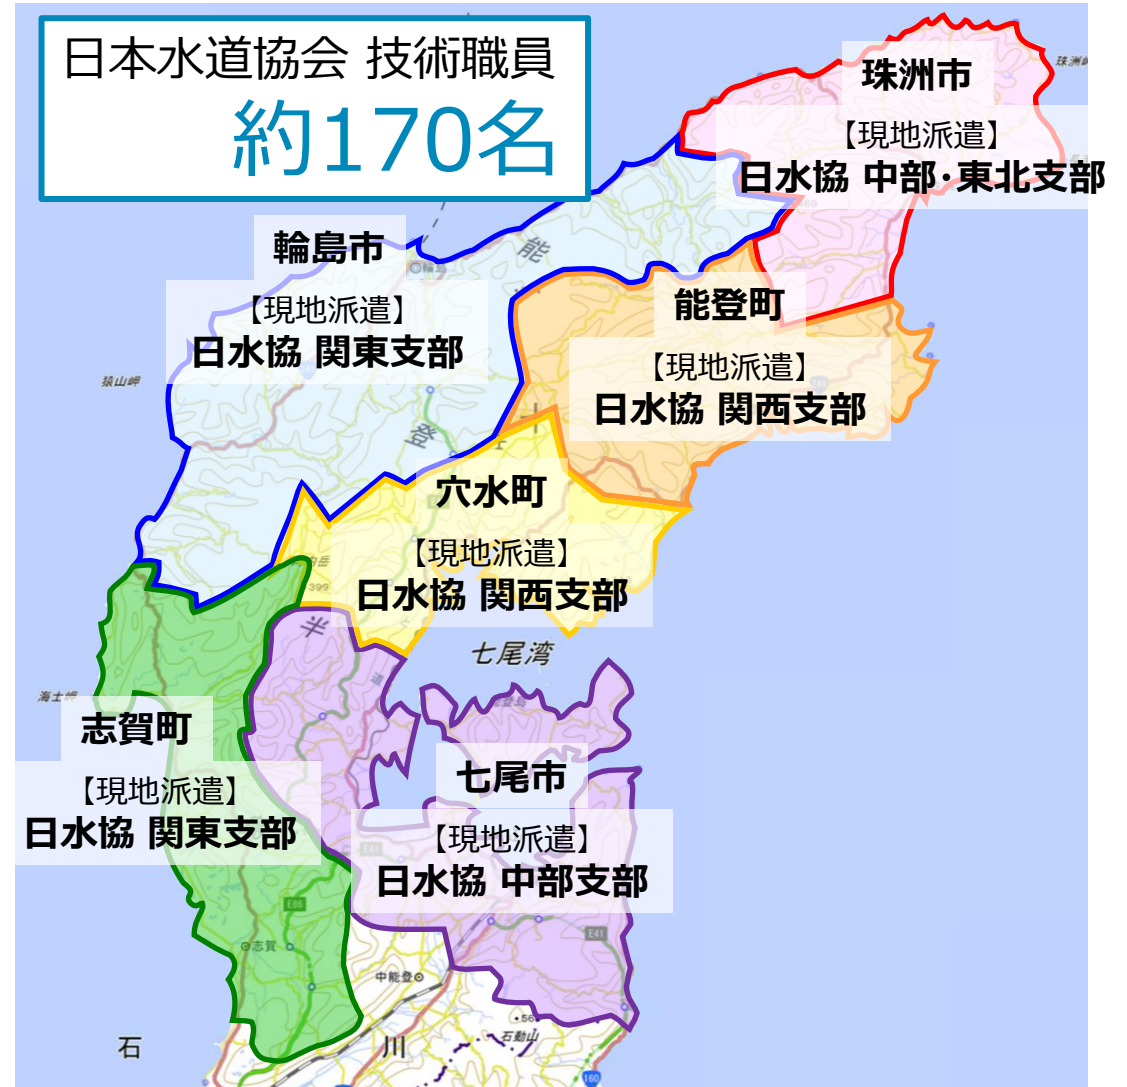

# 県の水道用水供給事業（県水）の概要



- **県の水道用水供給事業（県水）**では、手取川ダムを水源とし、鶴来浄水場から北は七尾市から南は加賀市まで**9市4町に送水**

給水市町：七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、津幡町、内灘町、金沢市、野々市市、白山市、能美市、小松市、加賀市

給水能力：約24万4千 $m^3$ （県全体の水道水の約4割）

送水管延長：約200km


- **県は各市町に設置した供給点（20箇所）まで送水、市町は供給点から各家庭へ配水**



手取川ダム



鶴来浄水場

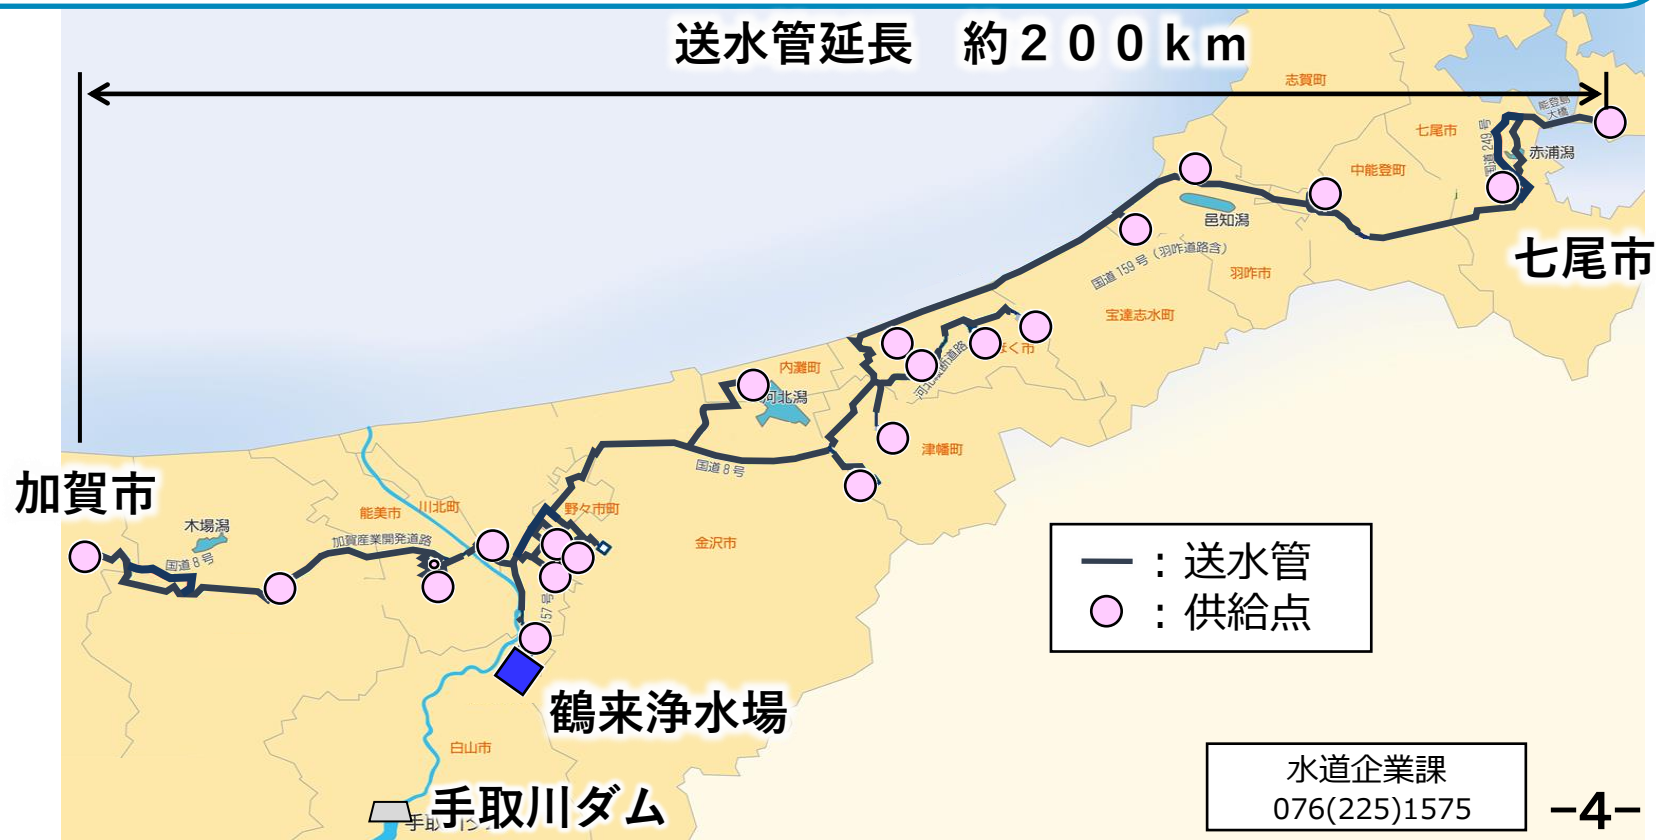

# 県水の送水状況と今後の見通し



- 地震発生後、内灘町以北の送水停止 ⇒ 南側から順次点検・補修 ⇒ 4日までに中能登町まで送水
- **中能登町で被害集中** ⇒ 同程度の被害が続くと**七尾市への送水に2カ月以上**（16日公表）  
 想定より被害が少なく、順調に点検・補修が進捗 ⇒ **29日(月)に七尾市の藤橋供給点※まで送水を開始予定**
- 引き続き、能登島までの早期復旧を目指す

※能登島除く七尾市内に送水



県水送水管の復旧作業



水道企業課  
076(225)1575

# 水道の復旧時期の見通し



(1月21日時点)

輪島市	2月末～3月末に仮復旧の見込み
珠洲市	2月末～一部地域で仮復旧の見込み。以降順次拡大 一部地域は4月以降となる見込み
穴水町	2月末～3月末に仮復旧の見込み
能登町	2月末～3月末に仮復旧の見込み
七尾市	七尾市街、和倉地区、能登島地区を中心に4月以降となる見込み それ以外は3月末までに仮復旧の見込み ※県水の進捗状況を踏まえ、市において見直し中
志賀町	2月末までに仮復旧 一部地域は3月末に仮復旧の見込み

※天候や不測の事態などにより遅れる可能性がある

# 下水道等の被災状況と対応

## 被害

### ○ 県内 17市町で下水道の被害発生

処理場: 5市町(七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)  
管路: 17市町

### ○ 能登を中心に集落排水、コミュニティ・プラント 合併処理浄化槽も被害発生



＜下水道等の普及率 (R5.3末) ＞

	下水道	集落排水	コミプラ・浄化槽*2
能登 6市町*1	50%	13%	19%
石川県	86%	5%	5%

\*1 七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町  
\*2 コミュニティ・プラント、合併処理浄化槽

## 点検・復旧

(1/24時点)

### ○ 下水道については、関係団体より**最大465名/日**の応援職員派遣 (国交省、下水道事業団、下水道管路管理業協会、県外自治体等)

⇒**管路**: 県全体 → 点検済1,860km(95%) → **25%被災**  
奥能登 → 点検済 320km(77%) → **71%被災**  
順次、応急復旧実施中

### ○ 集落排水、コミュニティ・プラント・合併処理浄化槽は、順次点検・応急復旧実施中 (農水省、環境省、地域環境資源センター、土地改良連合会、漁村総研、浄化槽協会等より派遣)

