

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

珠洲市

時点

令和7年6月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

整備予定地区



工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考	
					R6年度		R 7 年度			R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3
①	(仮称) 馬縹町団地	復興公営住宅		用地										入居見込は R 8 年度中 ※前倒しに向け て調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計	基本 計画									
		計画戸数	10戸	造成										
		建て方	戸建	建築工事										
		構造	木造平屋	入居										
		供給戸数											10戸	
②	(仮称) 飯田町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計	基本 計画									
		計画戸数	20戸	造成										
		建て方	集合	建築工事										
		構造	RC造3階	入居										
		供給戸数											20戸	
③	(仮称) 宝立町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計										
		計画戸数	15戸	造成										
		建て方	未定	建築工事										
		構造	未定	入居										
		供給戸数											15戸	
④	(仮称) 正院町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中
		事業主体	珠洲市	建築設計										
		計画戸数	35戸	造成										
		建て方	未定	建築工事										
		構造	未定	入居										
		供給戸数											35戸	

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称

珠洲市

時点

令和7年6月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、
今後随時変更の可能性がある。

整備予定地区



工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考		
					R6年度		R7年度				R8年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3	
⑤	(仮称) 三崎町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計											
		計画戸数	20戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											20戸		
⑥	(仮称) 高屋町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計											
		計画戸数	10戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											10戸		
⑦	(仮称) 狼煙町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計											
		計画戸数	10戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											10戸		
⑧	(仮称) 上戸町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計											
		計画戸数	15戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数											15戸		

復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称


珠洲市

時点

令和7年6月30日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

整備予定地区

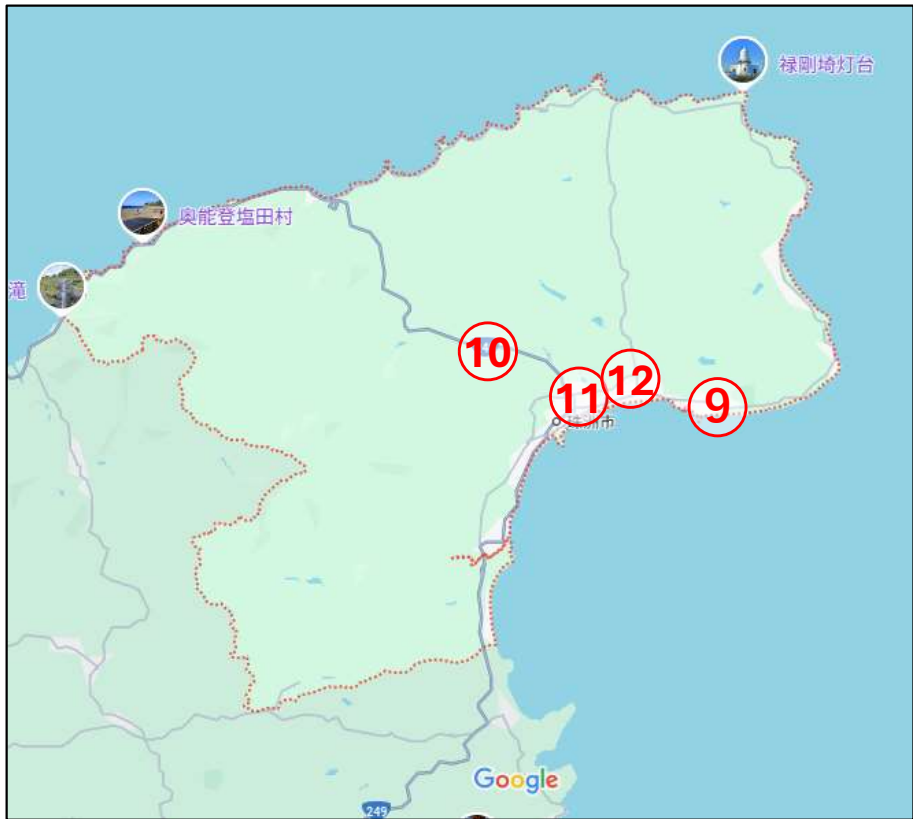

工程表

No.	地区名	事業手法		項目	工程								備考		
					R6年度		R 7 年度				R 8 年度				
					1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12		1-3	
⑨	(仮称) 蛸島町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計					調整中						
		計画戸数	30戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数										30戸			
⑩	(仮称) 若山町団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計					調整中						
		計画戸数	30戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数										30戸			
⑪	(仮称) 飯田町② 団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計					調整中						
		計画戸数	10戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数										10戸			
⑫	(仮称) 野々江町 団地	復興公営住宅		用地										※入居見込は 調整中	
		事業主体	珠洲市	建築設計					調整中						
		計画戸数	25戸	造成											
		建て方	未定	建築工事											
		構造	未定	入居											
		供給戸数										25戸			
